



Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №16»

**Паспорт лин - проекта
«Оптимизация процесса размещения необходимой
информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях
ДОО»**

Береза Н.В., старший воспитатель
Потякина Е.С., воспитатель
Тараскина Т.Ю., воспитатель
Жаркова Е.В., учитель-логопед

Паспорт лин-проекта «Оптимизация процесса размещения необходимой информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОО»

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»

Оптимизация процесса размещения необходимой информации на сайте,
в мессенджерах и социальных сетях ДОО
Паспорт лин-проекта



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 16
(О.В.Калашникова)

Общие данные: Заказчик: Заведующий МБДОУ № 16 Процесс: размещение необходимой информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОО Границы процесса: с момента получения информации до размещения ее на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОО Руководитель лин-проекта: Береза Н.В., старший воспитатель Команда лин-проекта: Потякина Е.С., воспитатель; Тараскина Т.Ю., воспитатель; Жаркова Е.В., учитель-логопед.			Обоснование: 1. Потеря времени при изучении и корректировке информации. 2. Необходимость размещения информации в разных информационных источниках. 3. Разностилевое оформление текстовой информации.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование лин-проекта - 21.03.2022г.-25.03.2022		
Сокращение временных затрат при подготовке и размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОО	3 часа	1 час	2. Картирование текущего состояния - 28.03.2022г. - 10.04.2022г.		
Эффекты: 1. Экономия времени; 2. Размещение актуальной и проверенной информации без задержки; 3. Создание единого стиля оформления информации			3. Анализ проблем и потерь - 11.04.2022г. - 24.04.2022г.		
			4. Составление карты целевого состояния - 25.04.2022 г. - 08.05.2022г.		
			5. Разработка плана мероприятий - 09.05.2022г. - 22.05.2022г.		
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 23.05.2022г. – 29.05.2022г.		
			7. Внедрение улучшений – 30.05.2022г. - 12.06.2022г.		
			8. Мониторинг результатов – 13.06.2022г. – 19.06.2022г.		
			9. Закрытие лин-проекта – 20.06.2022г. – 26.06.2022г.		
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 27.06.2022г. – 30.06.2022г.		

Команда лин-проекта



Береза Наталья Валерьевна – старший воспитатель – куратор проекта



Потякина Екатерина Сергеевна - воспитатель



Жаркова Елена Вячеславовна – учитель-логопед



Тараскина Татьяна Юрьевна - воспитатель

Пирамида проблем

Количество и перечень проблем с разбивкой по уровням решения

Министерство просвещения РФ


Не выявлены

Министерство образования и науки Кузбасса

Не выявлены

МБДОУ «Детский сад №16»

- *Длительный процесс подготовки информации.*
- *Избыточность информации.*
- *Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.*
- *Разнотипное оформление текстовой информации.*
- *Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения*

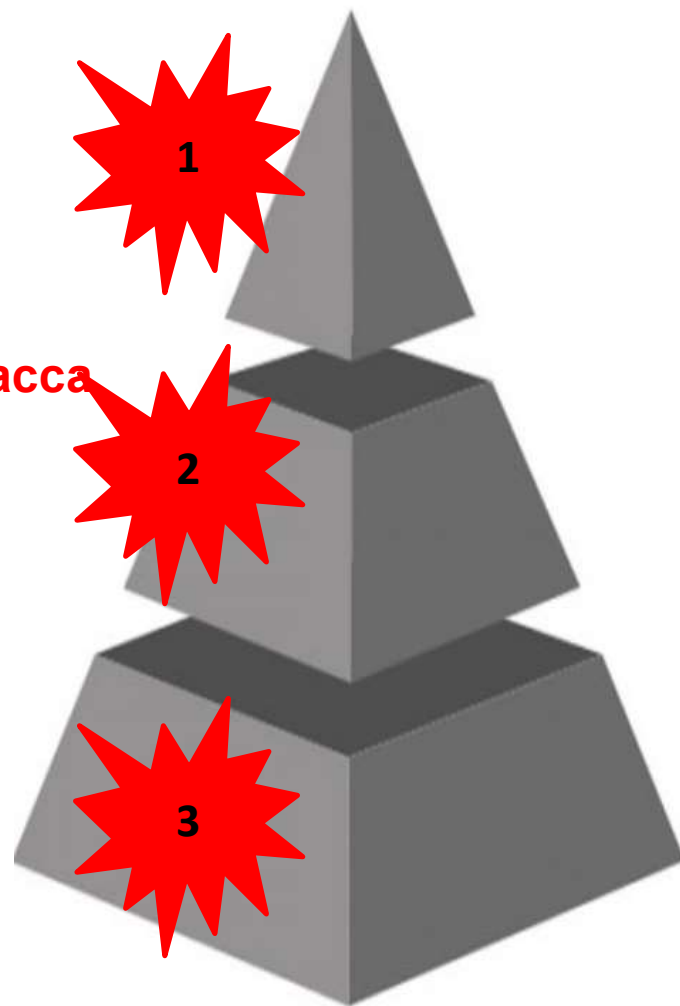

Анализ проблем

Проблемы	Способ решения	Экономия времени
Длительный процесс подготовки информации	Печать текста в мессенджере	Сокращение ВПП (40 минут – 18 минут)
Избыточность информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Сокращение ВПП (10 минут – 3 минут)
Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Сокращение ВПП (30 минут – 15 минут)
Разнотипное оформление текстовой информации	Передача информации по электронной почте. Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	Сокращение ВПП (15 минут - 3 минут)
Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения	Передача материалов по электронным формам связи	Сокращение ВПП (15 минут - 5 минут)

План мероприятий

№ п/п	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного	Сроки
1	Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения	Занятость педагогов	Передача материалов по электронным формам связи	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Педагоги	19.02.2021г-21.02.2021г
2	Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации и	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Заведующая, старший воспитатель, педагоги	22.02.2021г-26.02.2021г
3	Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Утвержденный алгоритм подготовки информации на сайт учреждения	Делопроизводитель, старший воспитатель, педагоги	26.02.2021г-01.03.2021г
4	Разностилевое оформление текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов	Утверждение шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов	Заведующая, старший воспитатель, педагоги	25.02.2021г-02.03.2021

Карта текущего состояния процесса



- 1 Избыточное количество информации
- 2 Разностилевое оформление информации, отсутствие структуры текста
- 3 Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом
- 4 Отправка информации разными мессенджерами
- 5 Отсутствие ответственного за организацию процесса


ВПП (время протекания процесса):
126 мин-185 мин

Карта текущего состояния процесса



ВПП (время протекания процесса): 44 мин-75мин

Достигнутые результаты

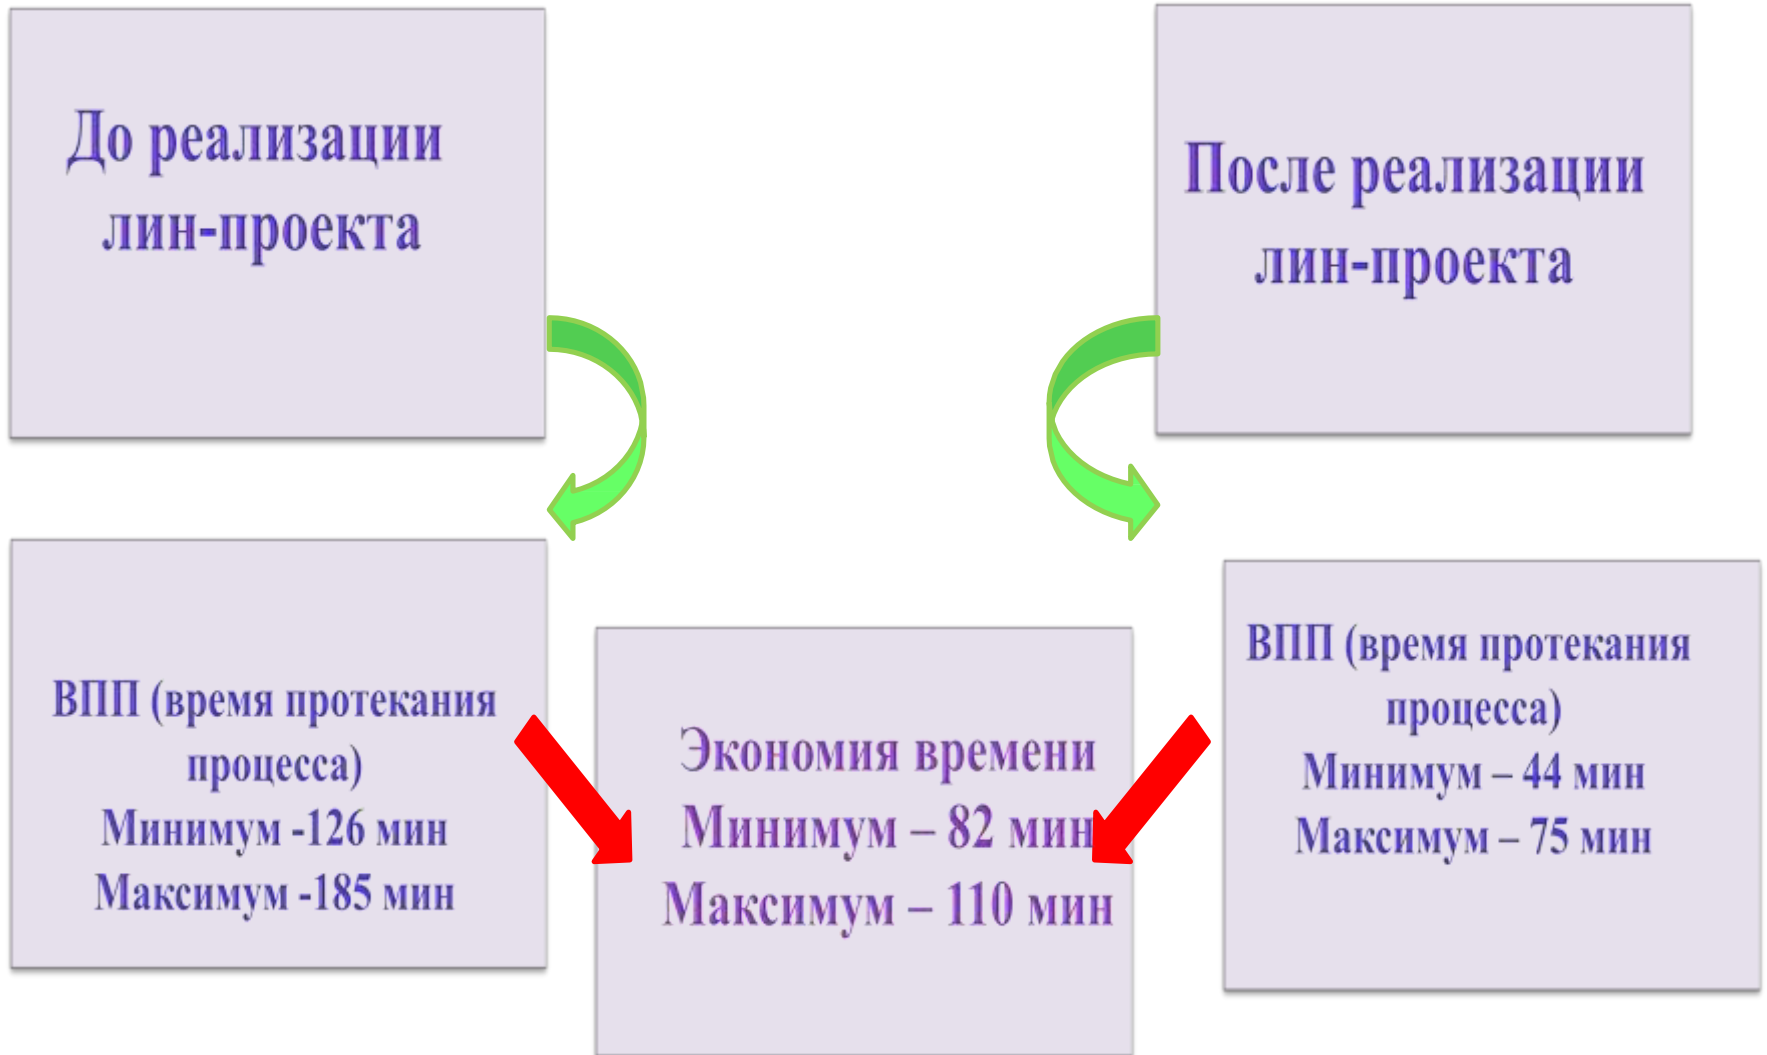

Достигнутые результаты

<p>До реализации лин-проекта</p>	<ul style="list-style-type: none">• Длительный процесс подготовки информации• Избыточность информации• Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом• Разностилевое оформление текстовой информации• Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения
<p>После реализации лин-проекта</p>	<ul style="list-style-type: none">• Вся информация передается по электронным формам связи• Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)• Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений• Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля

Приглашаем к сотрудничеству!

МБДОУ № 16

Ленинск-Кузнецкого городского округа

652523, РФ,

Кемеровская область - Кузбасс,

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 61/4

Телефоны: (838456) 2-08-17; 2-08-42

Сайт: <https://doy16.tvoysadik.ru/>

Электронная почта: doy16@mail.ru
